

Exposição Problemas Obra Telhado Bloco 2 Heleri e Providências

10/11/2025

Abertura

- Assembleia Geral Extraordinária requisitada para exposição, esclarecimentos e deliberação sobre mudança na condução dos problemas identificados na obra do telhado bloco 2, e conforme convocação emitida em 03 novembro de 2025

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2025.
APA - 0745 / 002 / 2025

Ilmo^(a). Sr.^(a).
CONDÔMINO(A) DO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HELERI
Rua Silva Guimarães nº 24 – Tijuca, RJ.
Nesta.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente edital de convocação, atendendo solicitação do Sr. Síndico, convocamos os senhores Coproprietários do Condomínio do Edifício **HELERI**, para comparecerem na **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no **dia 10 de novembro de 2025**, no hall dos elevadores do prédio, às 18:30 horas em primeira convocação, com quorum legal, ou **às 19:00 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de condôminos presentes**, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. ESCLARECIMENTOS e DELIBERAÇÕES SOBRE PEDIDO DE MUDANÇA DE ESTRATÉGIA NA CONDUÇÃO DE PROBLEMAS COM OBRAS NO TELHADO NO BLOCO 2 – DOTAÇÃO DE VERBA.

Considerando o assunto relevante a ser tratado, pedimos o comparecimento de todos ou representados por procuradores legalmente habilitados, apresentando instrumento particular revestido de todas as formalidades legais, inclusive com o reconhecimento da assinatura, conforme artigo 654 do Código Civil e devidamente quites com suas obrigações condominiais, tendo em vista que as decisões tomadas na Assembleia obrigarão a todos, presentes e ausentes.

Atenciosamente,


MARCELO SOARES DA CRUZ
GERÊNCIA CONDOMÍNIOS
EMAIL: CONDOMINIO@PREDIALAPOLO.COM.BR

Tempo de Execução do Projeto

- Hoje 10/11/2025 – semana 46 de 2025
- **Início da Obra semana 29 de 2025**
- SALDO:
 - **120 dias transcorridos** desde o início das obras
 - **17 semanas transcorridas**

Cronologia Últimos Eventos ...

25/09 – Reunião Síndico e Conselheiros




Ajuste de alinhamento de telhado. Se forem pedidas novas telhas o condomínio não vai arcar com frete já a empresa devolveu telhas informando quenão as necessitava.

Teste de estanqueidade. Lâmina de água na calha por pelo menos 7 dias. Verificar no Apt 402 se aparece humidade ou novas manchas. Determinar em qual data poderá ser feito o levantamento de danos do Apt 402 e quando poderá ser feita a composição do mesmo.


Apt 402 vai sugerir orcamentos para a obra de recomposição

- (1) Dentre outros assuntos, dispôs sobre modus operandis do teste de estanqueidade

17/10_(D96) – comunicado “*fim do telhado*”

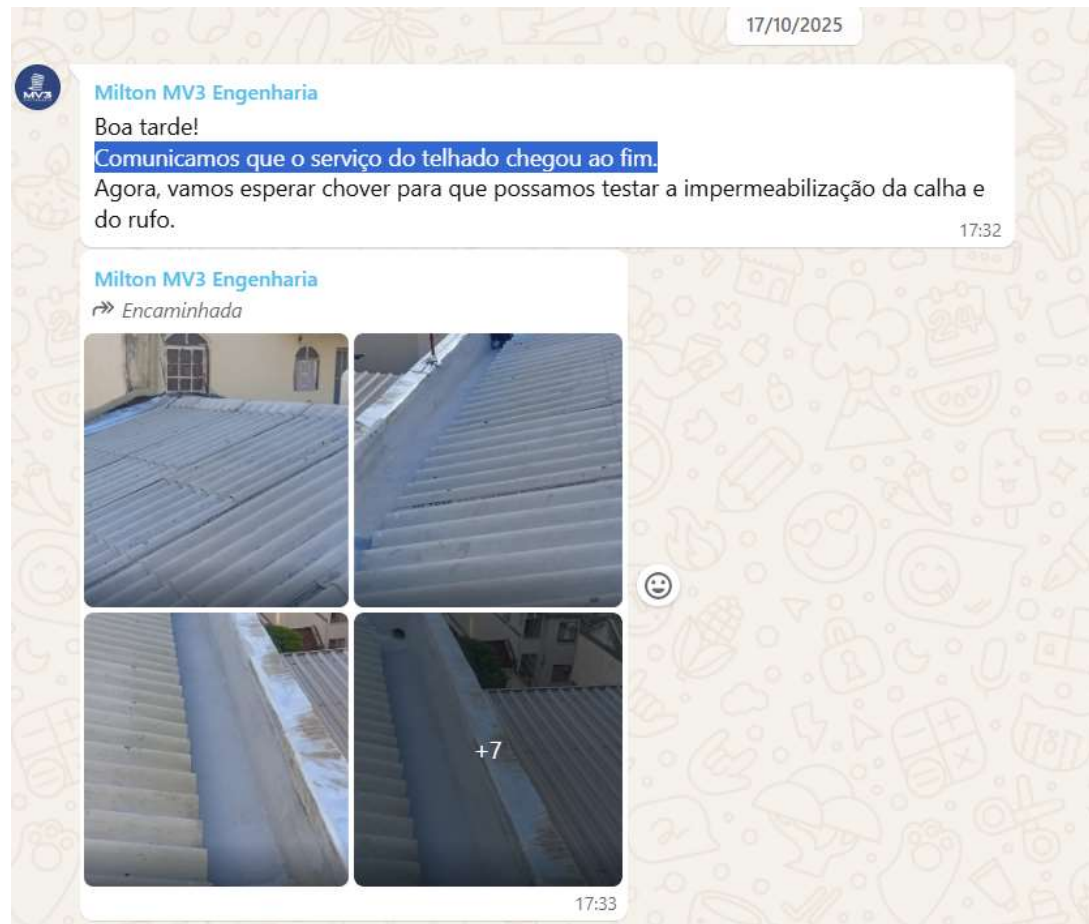


MV3 informa que “**vamos esperar chover para que possamos testar a impermeabilização da calha e do rufo**”

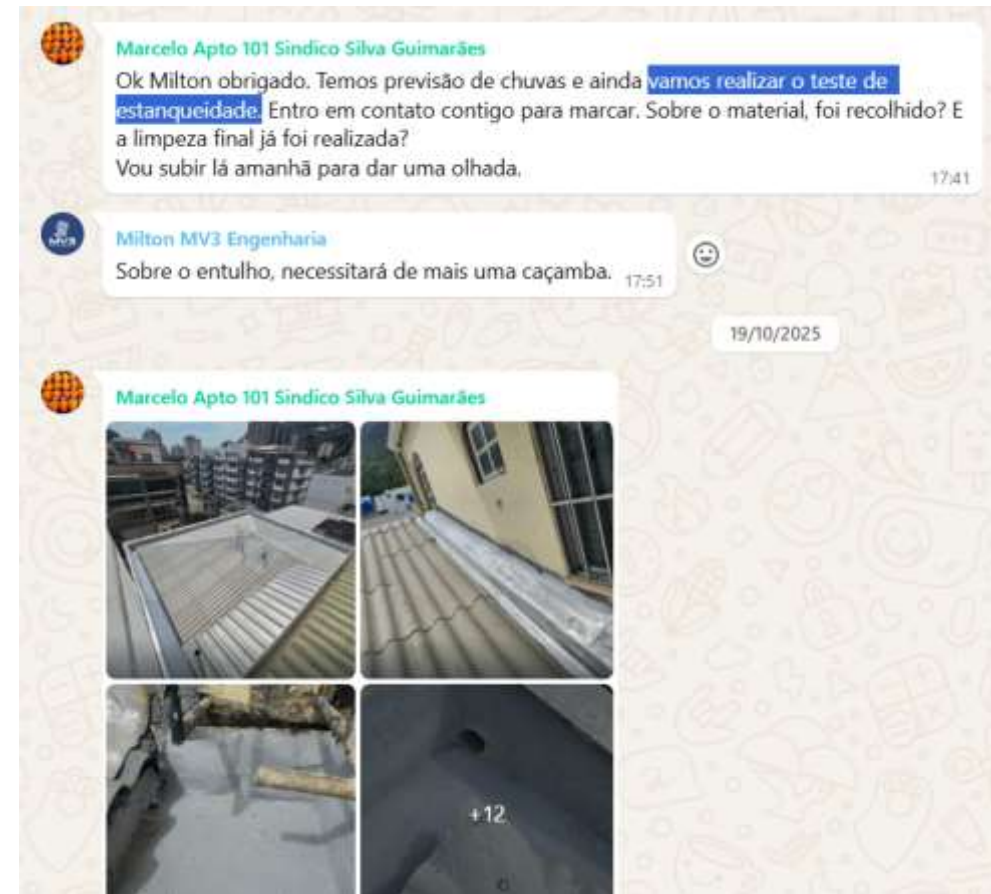

Marcelo frisa que haverá teste estanqueidade

19/10 (D98) – identificado problemas no acabamento externo

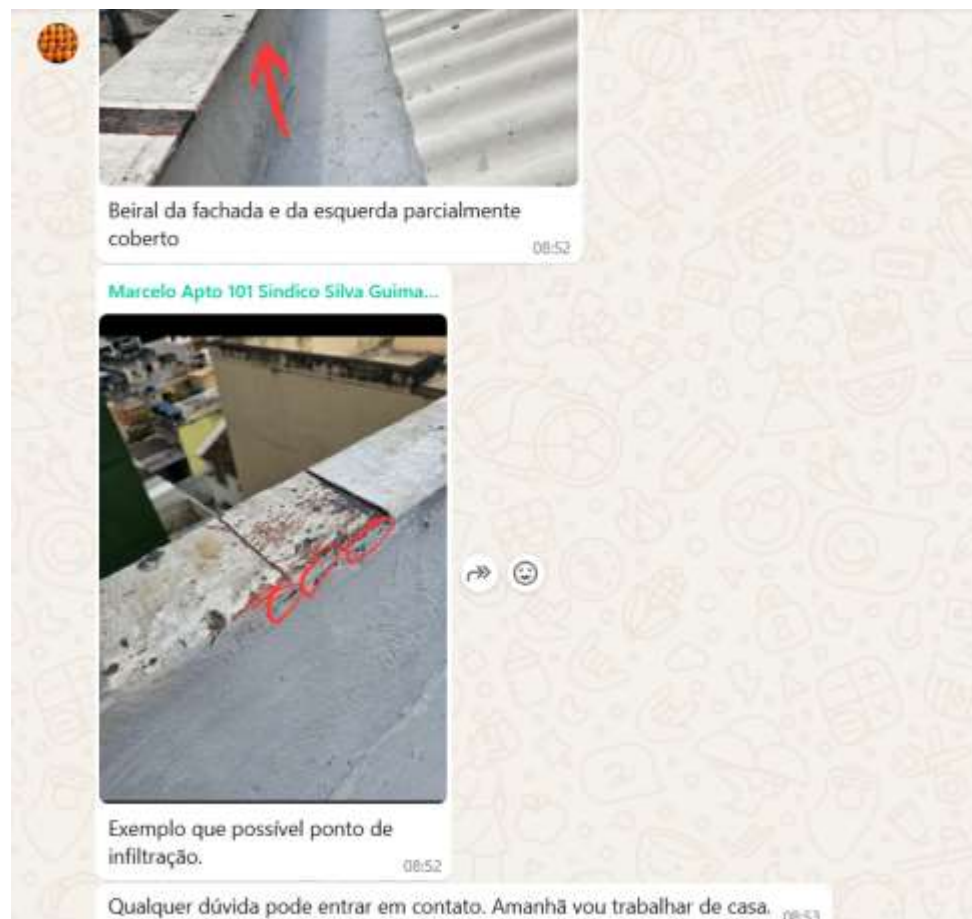

Marcelo aponta falhas no acabamento da mureta com segmentos alternados sem proteção – ao que MV3 informa “*mureta não estar no escopo*”



Dona Lucia registra trecho em que a manta não está colada

21/10 (D100) – subida na laje lado interno via 402




Identificação de **telha furada** sobre o alçapão do 402




Confirmada entrada de água devido chuvas.
De maneira símile a antes do início das obras.

21/10 – Lista de problemas registrados

- (1) Água tomando extensão equivalente aos seguintes cômodos do 402: sala, antessala, quarto Q1, quarto Q2, e provável entrada abaixo da Cobertura
- (2) Telha furada
- (3) Ralo sem tampa
- Pedido de: **PROVIDÊNCIA DE URGÊNCIA**

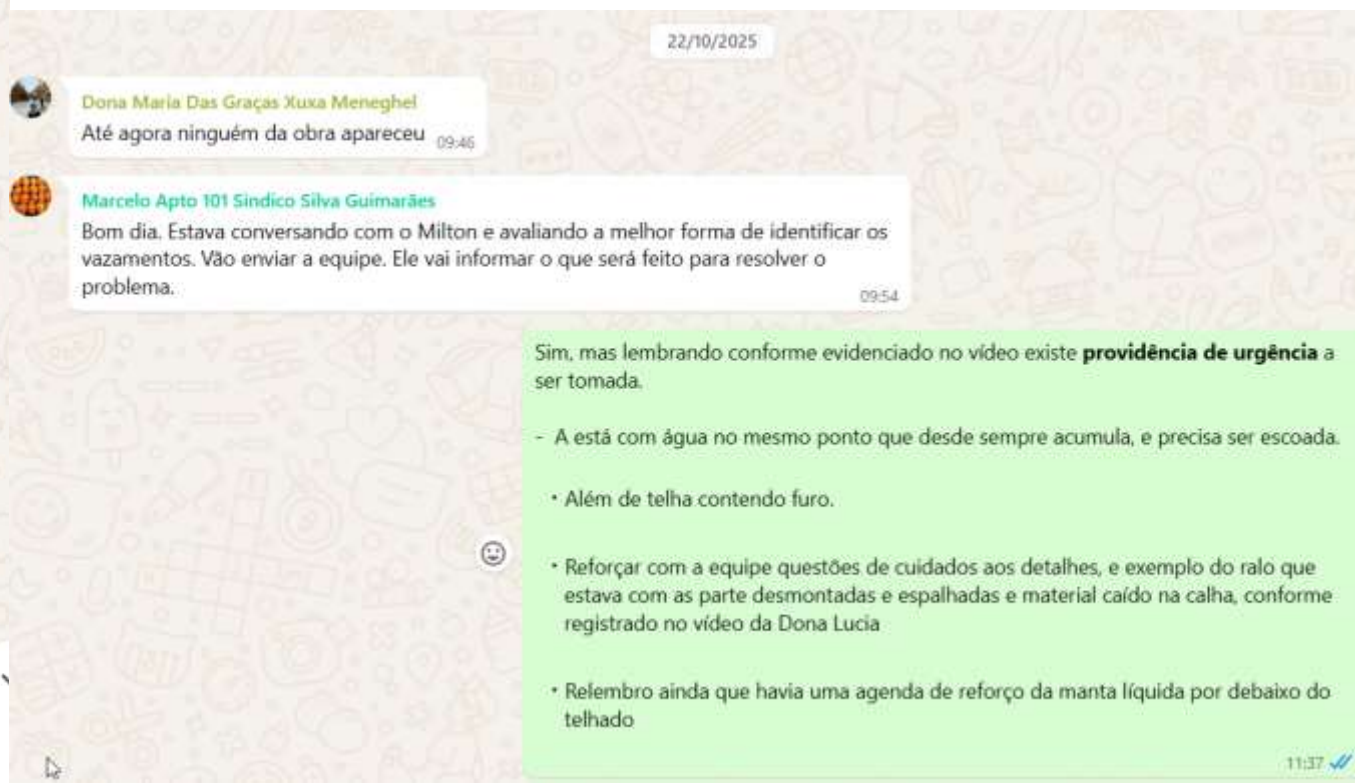

24/10 (D103) – Frisando problema impermeabilização calhas

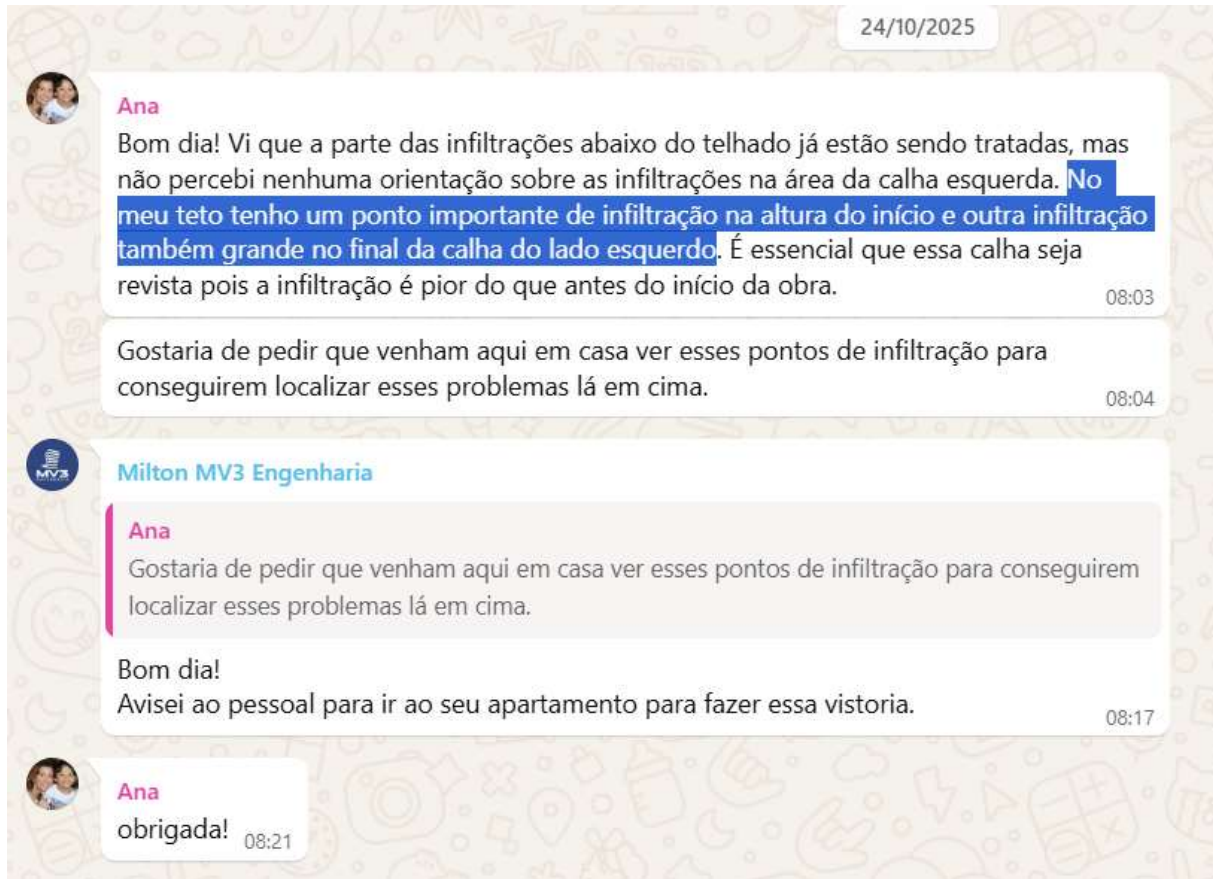

- (1) Nesse ponto, conforme pode ser conferido no histórico do grupo de Whatsapp “Acompanhamento Obra Telhado B12” não há mais exposição ativa da MV3.
- (2) Não há cronograma, conforme combinado
- (3) Os informes de plano de ação têm que ser cobrados com reincidência
- (4) Falta clareza nas respostas. Exemplo: “... *item que está faltando...*” (quais?)

- Ana 402 cobra que seja feita visita para verificar **umidade no ponto da calha. CONTINUAMOS COM INFILTRAÇÃO**. IMPERMEABILIZAÇÃO NÃO EFETIVA

01/11 (D111) – Início teste estanqueidade – forte goteira

- (1) Marcelo dá ciência sobre execução do teste de estanqueidade às 11:14. Às 11:53 identificada forte goteira no 402



01/11 (D111) – Volume água na laje – teste estanqueidade



Você

01/11/2025 às 16:24

- (2) Registro em vídeo 01/11/2025 às 16:24 de que a obra não conseguiu conter a água do teste de estanqueidade iniciado às 11:14 pelo Marcelo

02/11 (D112) – Impossibilidade escoamento de água



- (1) Ao tentar remover água do dia 01/11, Leonardo informa Marcelo não ser possível escoar o volume de água
- (2) Em conversa com Marcelo MV3 afirma que não realizará escoamento da água, por “*não ter sido envolvida da realização do teste*”
- (3) Grande volume retido na laje. Agregando peso. Danificando madeiramento.
- (4) Manta líquida da laje danificada
- (5) vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=IYXZLLkc0_0




Você

02/11/2025 às 15:10


02/11 (D112) – Registro descumprimento cláusula limpeza



- (6) Continuando verificação encontra-se lixo amontoado. **Após telhado fechado e anúncio de descida de todo entulho.**
- (7) Identificado entre resíduos **perda de material cimento**
- (8) vídeo: <https://youtu.be/majow2sTRAY?si=bxUll23XwXvYhSv>



02/11 (D112) – Questão do embolso interno





- (9) Embolso interno foi negligenciado.
- (10) ainda no vídeo: <https://youtu.be/majow2sTRAY?si=bxUll23XwXvYhSv>

02/11 (D112) – Permanece telha furada



- (11) Verificada que **telha furada reportada em 21/10 não foi trocada.**
- (12) Obs: custo de aquisição telhas novas foi **R\$ 7.404,90** (\$6.735,50+\$569,40), tendo sido **devolvidas 20 e readquirida 6**



02/11 (D112) – Problema do Encaixe das Telhas - Fiada

02/11/2025

Por fim estamos em processo de investigação por norma a questão do alinhamento das telhas conforme documentado em vídeo abaixo:

16:42 ✓✓



2 de novembro 2025 - documentando desalinhamento das telhas

Aproveite vídeos e músicas que você ama, youtube.com

https://youtu.be/n8bZjUm_msE?si=CWv8iN4iUXX1FS74

16:42 ✓✓

@Milton MV3 Engenharia , peço que analise o vídeo acima, na competência de engenheiro, e verifique questões e riscos envolvidos na integridade do telhado. Estamos fazendo o mesmo por aqui.

16:44 ✓✓

por aqui.

02/11/2025

16:44 ✓✓




Essas são as fotos de encerramento. Mostram nos pontos sinalizados entrada expressiva de luz, que não ocorre em outros pontos

16:44 ✓✓



- (13) vídeo: https://youtu.be/n8bZjUm_msE?si=CWv8iN4iUXX1FS74
- (14) exposição do motivo do porquê está fora de conformidade, arquivo “20251107_Nao_Conformidade_Fiada_Encaixe_Telhas.docx”

03/11 (D113) – Síndico formaliza itens em tratativa



- (1) Síndico formaliza parte 1 de 2 do documento contendo itens em tratativa que demandam resposta da MV3

03/11 (D113) – Tratativa água empoçada desde 01/11

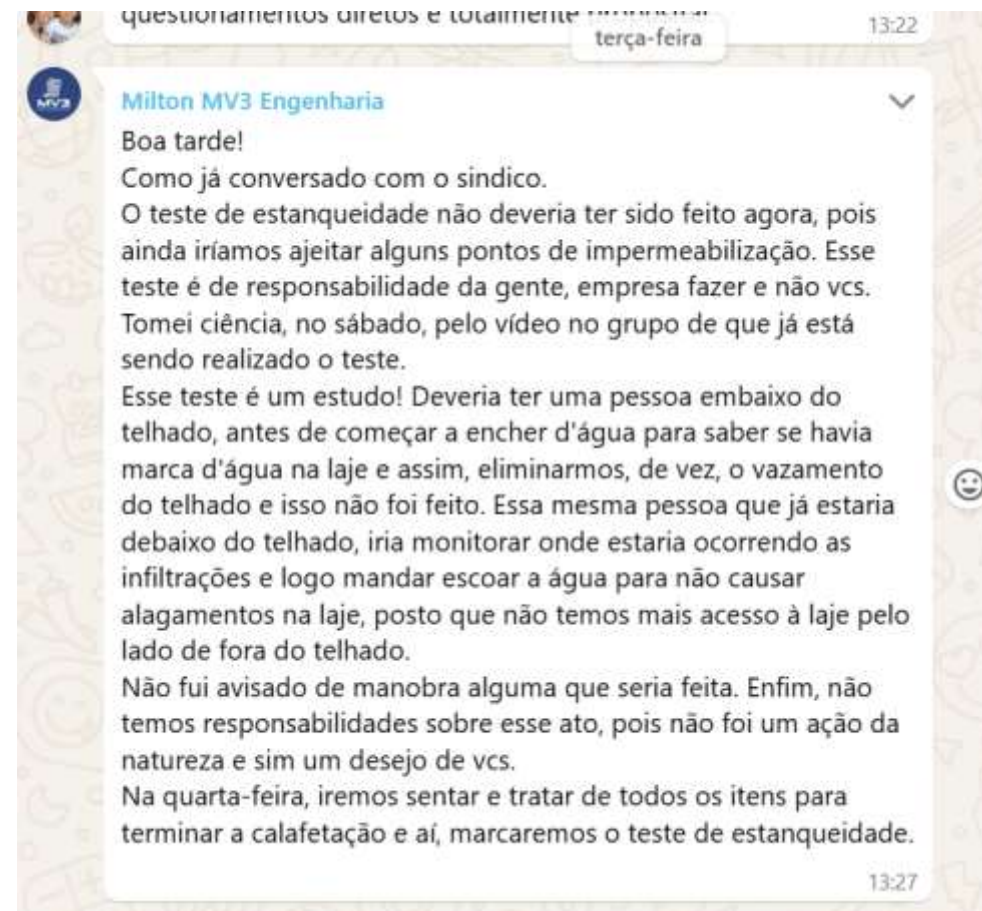

- (2) Em momento algum desde 17/10 (anúncio “fim do telhado”) MV3 se manifesta com cronograma ou plano, ou exposição clara sobre impermeabilização das calhas (lado externo). MV3 **após ser pressionada a se manifestar**, se posiciona eximindo-se de culpa pela entrada d’água
- (3) O argumento coloca ônus de secagem da laje para Síndico Marcelo.

03/11 (D113) – Marcelo escoia água – madeiramento solto



- (4) Marcelo realiza escoamento de água utilizando bomba. Durante manobra é identificado madeiramento solto
- (5) vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=iYfpLZ82a8w>



03/11 (D113) – Nova telha perfurada identificada



- (6) Ainda por ocasião do escoamento, além do madeiramento solto, nova telha perfurada é identificada
- (7) vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KkOYNWc0_lk

Propostas resolução

- Adição de perito para avaliação
- Suspensão pagamento por motivos causados pela empreiteira (extrapolação custos, imperícia técnica etc)
- ... Abrindo palavra AGE


ANEXO I

Histórico de Contratação

Proponentes da AGE março-2025

Obra no telhado bloco 2 + Recomposição apt 402

Empresa	Valor	Execução	Garantia	CNPJ
R&C	R\$ 54.000,00	120 dias corridos	5 anos	OK
Pró Obras	R\$ 32.000,00	45 dias úteis	5 anos	OK
Muniz Construções	R\$ 25.743,75	45 dias úteis	5 anos	OK
FG Construções	R\$ 34.000,00	35 dias úteis	3 anos	OK
FG Construções (Telha Ecológica)	R\$ 38.500,00	35 dias úteis	3 anos	OK
MV3 Engenharia	R\$ 33.850,00	30 dias útris	2 anos	OK



Clique para adicionar anotações

Primeira proposta da MV3 (serviço+material)

Vimos por meio desta apresentar-lhes o nosso orçamento para execução do serviço abaixo citado, sendo o mesmo para **MATERIAL E MÃO DE OBRA:**

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELERI	
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA C31/2025	
LOCAL: Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ	FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: Zona Norte - Março / 2025	(x) ()
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (Trinta) dias trabalhados	ADM. DIRETA ADM. INDIRETA
MEDIÇÃO TOTAL DA LAJE: Prédio Residencial	DATA: 22/03/2025
A/C.: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)	E-MAIL: marcelolopessilva@gmail.com
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA:	
VALOR DO SERVIÇO:	R\$33.850,00 (Trinta e três mil, oitocentos e cinquenta reais)
ENTRADA 50%:	R\$16.925,00 (Dezesseis mil, novecentos e vinte e cinco reais)
PARCELA INTERMEDIÁRIA: para 7 dias	R\$4.231,25 (Quatro mil, duzentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos)
PARCELAS MENSAIS: 3	R\$4.231,25 (Quatro mil, duzentos e trinta e um reais e vinte cinco centavos)
GARANTIA: 24 (Vinte e quatro) meses - Garantia somente do telhado e da impermeabilização das calhas	
INÍCIO DOS SERVIÇOS: Destacamento de equipe, imediato	
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 (Trinta) dias trabalhados	
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (Dez) dias	

- Quando: Març/jun 2025
- Menor preço foi “Construções” porém não possuía ART
- Recorre-se a **MV3**
- Proposta inclusa material e mão de obra **no valor de R\$ 33 mi**
- ...
- Heleri **não tem caixa**
- Por consequência: Para compor o caixa seria necessário aguardar e **perder janela de estiagem** do ano (julho-agosto-setembro)

Segunda proposta da MV3 (somente serviço)

Vimos por meio desta apresentar-lhes o nosso orçamento para execução do serviço abaixo citado, sendo o mesmo para **MÃO DE OBRA:**

CONDOMÍNIO HELERI	
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA C31B/2025	
LOCAL: Rua Silva Guimarães, 24, Tijuca - Rio de Janeiro / RJ	FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO / MÊS DE REFERÊNCIA: Zona Norte - Março / 2025	(x) ()
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (Trinta) dias trabalhados	ADM. DIRETA ADM. INDIRETA
MEDIÇÃO TOTAL DA LAJE: Prédio Residencial	DATA: 26/06/2025
A/C.: Sr. Marcelo Lopes da Silva (Síndico)	E-MAIL: marcelolopessilva@gmail.com
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA: MÃO DE OBRA	
VALOR DO SERVIÇO:	R\$24.020,00 (Vinte e quatro mil, e vinte reais)
ENTRADA:	R\$7.000,00 (Sete mil reais)
PARCELAS: 4	R\$4.255,00 (Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)
GARANTIA: 60 (Sessenta) meses - Garantia do telhado e da impermeabilização das calhas	
INÍCIO DOS SERVIÇOS: Destacamento de equipe, imediato	
TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 30 (Trinta) dias trabalhados	
VALIDADE DA PROPOSTA: 10 (Dez) dias	
OBS: Valor para mão de obra de contrapiso entrará como aditivo, após o laudo do cálculo estrutural	

- Quando: Jun/jul 2025
- ...
- Por motivo da progressão dos danos no 402
- Para aproveitamento do calendário de estiagem do ano
- Para adequação de calendário de obras internas ao 402 então:
- **402 propõe alavancar o custo do material com ressarcimento futuro pós composição de caixa através de cota extra**
- ...
- **MV3 envia SEGUNDA proposta cobrindo mão de obra e especificação do material necessário**

ANEXO II

Apontamentos e Registros Gerais

Apontamentos semanais⁽¹⁾

- semana 45 2025
 - **2025-11-05** - d115 - Reunião adiada para terça 11/11. MV3 irá realizar inspeção na sexta 07/11 para tratativa na reunião de 11/11
 - **2025-11-03** - d113 - Síndico formaliza em documento com lista problemas identificados pelo 402. Agendada reunião dia 05/11 com MV3 para Heleri receber plano de ação
- semana 44 2025
 - **2025-11-01** - d111 - Na laje, por dentro do telhado, identificada grande quantidade de água empoçada. **Solicitada Assembléia Geral Extraordinária**. AGE agendada para segunda 11/11
 - **2025-11-01** - d111 - Marcelo realiza teste estanqueidade, calha lado direito, direção prédio 26. Registrada goteira região janela 402.
 - **2025-10-29** - d108 - Visita Milton acompanhado do Mateus
 - **2025-10-28** - d107 - **Relatório de custos** de aquisição até item 30
 - **2025-10-27** - d106 - Liberado recolhimento da caçamba diante da afirmação "...tudo que era de entulho foi retirado..."
- semana 43 2025
 - **2025-10-24** - d103 - Aquisição 30 referente a serviço de caçamba (R\$ 450)
 - **2025-10-24** - d103 - Ana 402 frisa importância de verificar ponto referente calha esquerda, devido reflexo de parede umedecida
 - **2025-10-24** - d103 - Disponibilizado acesso via 402 para realização dos acabamentos mureta alçapão e aplicação manta líquida laje. Serviço não realizado. Priorizada instalação mantas aluminizadas. Aquisição 29
 - **2025-10-21** - d100 - Reportado "**telha furada**" logo acima do alçapão. Reportado **entrada** de **água da chuva**
- semana 42 2025
 - **2025-10-17** - d96 - MV3 comunica "...*Comunicamos que o **serviço do telhado** chegou ao **fim**...*", e solicita aguardar chuva para "... *testar a impermeabilização da calha e do rufo*..."
 - **2025-10-16** - d95 - Enfatizando **previsão de chuva forte** para sábado 18/10
 - **2025-10-14** - d93 - Registro de **reclamação** devido "**ocorrer infiltração em fase final do projeto**". Registrado em vídeo
- semana 41 2025
 - **2025-10-06** - d85 - Informado "**2 dias para terminar a obra**"
- semana 40 2025
 - **2025-09-29** - d78 - Anotações de questões para regramento de obras futuras. **Aquisição de telhas** na Cometa. Aquisição 26
 - **2025-09-26** - d75 - Verificada a **saída do César Telhadista**. Novo telhadista responsável: **Mateus**
- semana 38 2025
 - **2025-09-15** - d64 - **Reunião** membros **Conselho**. Início dos **checkpoints** e planejamento restauração interna 402
- semana 36 2025
 - **2025-09-05** - d54 - Comunicado ao Milton, **manchas** reportadas ao Cesar e Julio Cesar na **região da antessala** (abaixo cobertura)
 - **2025-09-05** - d54 - **Apuração** das aquisições até item 22 totalizando **R\$ 20.010,88**
 - **2025-09-02** - d51 - Solicitando ao Milton controle do **Voucher/Crédito** da devolução Tindiba (20 telhas + cumeeiras)

Apontamentos semanais⁽²⁾

- semana 32 2025
- **2025-08-08** - d26 - **Início da montagem** do telhado novo. Aviso de chuva
- **2025-08-06** - d24 - Verificada avaria das torneiras do tanque do terraço
- **2025-08-04** - d22 - Pedido de subida das telhas por içamento ao invés de "**corte das telhas**" por motivo de preservação do tamanho original e integridade do elevador e corredores. Cedido à alegação de "*a empresa tem mais capacidade técnica de avaliação*"
- semana 31 2025
- **2025-07-30** - d17 - Marcelo frisa à MV3 importância do caimento das calhas
- **2025-07-28** - d15 - **Fraude** aquisição 09 - caçamba Gabriel Hott Dias Andrade (R\$ 375,85)
- **2025-07-28** - d15 - **Priorizado o ralo** como contingência para telhado aberto. Aquisições 06 (R\$ 364,17) e 07 (R\$ 209,50) e 08 (R\$ 43,80).
- **2025-07-25** - d12 - Chuva de 23mm. **Ação emergencial de escoamento da água**. Colaboração Ana, Veronica e Marcelo. **Não havia ralo instalado**
- semana 29 2025
- **2025-07-18** - d5 - Criado arquivo **excel para controle** e monitoria da aquisição de material
- **2025-07-17** - d4 - Criado grupo **Whatsapp para acompanhamento das obras**, após questão de **não instalação do ralo**
- **2025-07-16** - d3 - **Segunda aquisição**, Chatuba Uruguai, no valor de R\$ 4.942,10. E **terceira aquisição**, Cometa Gal. Roca, no valor de R\$ 917
- **2025-07-15** - d2 - **Primeira aquisição**, na Chatuba Uruguai, valor de R\$ 1.127,56
- **2025-07-14** - d1 - **INÍCIO**: Registro do segundo dia de atividades da MV3. Discussão sobre **ponto de instalação do ralo**
- semana 26 2025
- **2025-06-25** - Pré-obra - **Visita de Milton e Enoque** da MV3 a laje via alçapão 402
- **2025-06-17** - Pré-obra - Delimitação do **escopo** das obras. **Impasse** na questão do **contrapiso**
- semana 22 2025
- **2025-05-28** - Pré-obra - **Proposta** pós-reunião de **alavancagem do material da obra**, devido não haver caixa do condomínio para cobrir entrada + material
- semana 17 2025
- **2025-04-26** - Pré-obra - Registro da expansão das manchas do teto da **sala 402** próxima a janela. **Antessala não afetada**
- **2025-04-05** - Pré-obra - Grande escoamento de água com baldes. Laje cheia de água e cheiro de esgoto
- **2025-04-01** - Pré-obra - Marcelo aplica lona tecril no telhado
- semana 13 2025
- **2025-03-24** - Pré-obra - Assembléia Geral Extraordinária
- **2025-03-20** - Pré-obra - Informe restituição do valor pago à antiga empresa que havia reparado a calha. Reparo não funcionou. Gotejamento persiste pós chuva.
